



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบครึ่งปีงบประมาณ)

องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบครึ่งปีงบประมาณ เดือนกันยายน
๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินโครงการและการ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระโนดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ และฉบับเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบครึ่งปีงบประมาณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายเลิศ คงเย็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด



รายงาน

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบครึ่งปีงบประมาณ)

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลระโนด รวมถึงฉบับแก้ไข ฉบับเปลี่ยนแปลงและฉบับเพิ่มเติม ได้นำโครงการไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีการเพิ่มเติม ๒ ครั้ง ในรอบครึ่งปีงบประมาณ(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม๒๕๖๗)

งานนโยบายและแผน ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗) ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดแสดงถึงจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการรวมไปถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำผลการติดตามและประเมินผลไปเป็นข้อมูลในการบริหารงานในช่วงครึ่งปีงบประมาณที่เหลือต่อไป

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบครึ่งปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)	๑ – ๕
แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖รอบครึ่งปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)	๖ – ๑๙
แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖รอบครึ่งปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)	๒๐ – ๒๔
แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖รอบครึ่งปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)	๒๕ – ๒๖

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐(รอบครึ่งปีงบประมาณ ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗)


๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ , แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ , แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ , แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๔

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๗		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖	๑๑,๗๕๙,๐๐๐	๓๐	๙,๖๔๐,๒๐๐	๒๒	๖,๑๗๘,๖๐๐	๒๐	๕,๙๕๒,๘๐๐	๒๒	๖,๔๗๗,๐๗๐	๑๔๐	๔๐,๕๕๗,๖๗๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	๗	๑,๔๐๐,๐๐๐	๕	๑,๙๔๑,๐๐๐	๓	๗๙๐,๐๐๐	๓	๑,๓๐๐,๐๐๐	๓	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๑	๗,๐๓๑,๐๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕			๕	๒๙,๓๘๖,๐๐๐	๒	๒,๔๘๐,๐๐๐					๗	๓๑,๘๖๖,๐๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖			๖	๒,๔๘๓,๐๐๐	๑๖๓						๑๖๙	๒,๔๘๓,๐๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗			๑	๔๔๙,๐๐๐	๔	๙,๘๐๐,๐๐๐					๕	๑๐,๒๔๙,๐๐๐
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๕๐	๑๔,๓๑๓,๒๔๐	๔๙	๑๔,๐๖๓,๒๔๐	๔๘	๑๓,๙๕๓,๒๔๐	๔๘	๑๓,๙๕๓,๒๔๐	๔๘	๑๓,๙๕๓,๒๔๐	๒๔๓	๖๙,๖๓๖,๒๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕	๒	๓๐๐,๐๐๐									๒	๓๐๐,๐๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗			๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๘	๘๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๗๔๕,๐๐๐	๑๐	๘๗๕,๐๐๐	๑๑	๑,๓๙๕,๐๐๐	๘	๑,๙๕๐,๐๐๐	๙	๑,๙๕๐,๐๐๐	๔๙	๕,๑๔๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๗๓๕,๐๐๐	๙	๗๓๕,๐๐๐	๙	๗๓๕,๐๐๐	๙	๗๓๕,๐๐๐	๙	๗๓๕,๐๐๐	๔๕	๓,๖๗๕,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๓๓๘,๐๐๐	๙	๓๓๘,๐๐๐	๙	๓๓๘,๐๐๐	๙	๓๓๘,๐๐๐	๙	๓๓๘,๐๐๐	๔๕	๑,๖๙๐,๐๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖			๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๔	๘๐๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงปลอดภัย	๑๐	๖๓๐,๐๐๐	๙	๖๒๕,๐๐๐	๙	๖๒๕,๐๐๐	๙	๖๒๕,๐๐๐	๙	๖๒๕,๐๐๐	๔๖	๓,๑๓๐,๐๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖			๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๔๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๗		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบ ประมาณ	จำนวนโครงการ	งบ ประมาณ	จำนวนโครงการ	งบ ประมาณ	จำนวนโครงการ	งบ ประมาณ	จำนวนโครงการ	งบ ประมาณ	จำนวนโครงการ	งบ ประมาณ
	๑๘	๑,๓๖๑,๕๐๐	๑๘	๑,๓๖๑,๕๐๐	๑๖	๑,๐๙๑,๕๐๐	๑๕	๑,๐๘๑,๕๐๐	๑๕	๑,๐๘๑,๕๐๐	๘๒	๕,๙๗๗,๕๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ												
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖												
รวม	๑๖๓	๓๑,๕๙๑,๗๕๐	๑๕๗	๖๒,๓๔๖,๙๕๐	๓๐๒	๓๗,๕๓๖,๓๕๐	๑๒๙	๒๔,๓๙๒,๕๕๐	๑๓๐	๒๗,๔๐๙,๔๑๐	๘๘๑	๑๘๓,๒๗๗,๓๗๐

แบบสรุปรูปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


๑. จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ โดยแบ่งเป็น

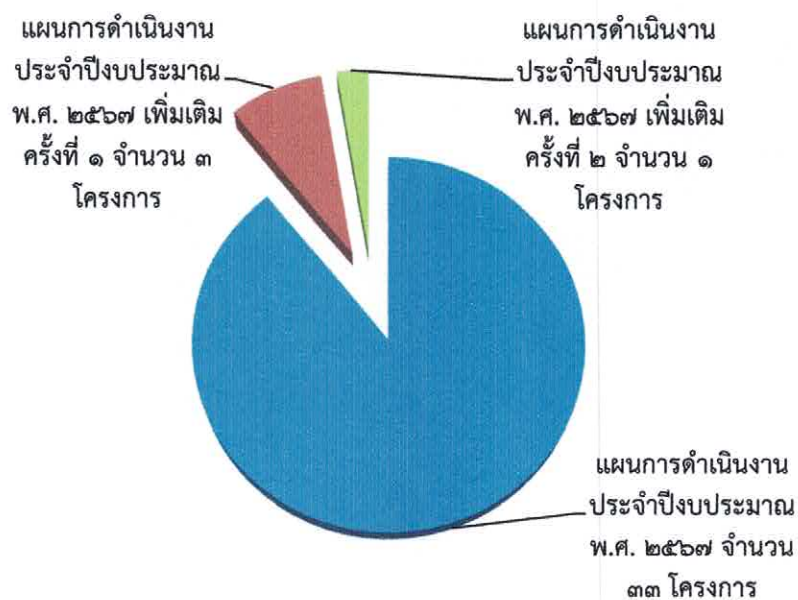

รูปที่ ๑ แสดงจำนวน โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม

๒. ผลการดำเนินโครงการ

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| ๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้ว | จำนวน ๑๖ โครงการ |
| ๒.๒ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ | จำนวน ๒๑ โครงการ |

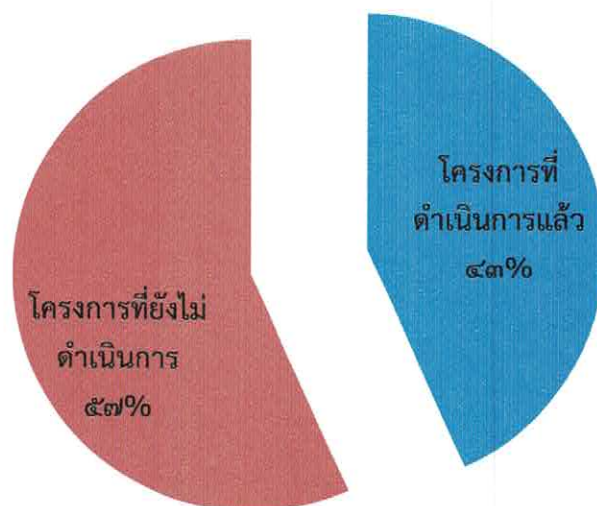

รูปที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการดำเนินการแล้วตามแผนการดำเนินงานประจำปี และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม


๓. ความสามารถในการดำเนินตามแผนการดำเนินงาน

๓.๑ ดำเนินการได้ตามช่วงเวลาในแผนการดำเนินงาน

จำนวน ๓๔ โครงการ

๓.๒ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามช่วงเวลาในแผนการดำเนินงาน

จำนวน ๓ โครงการ

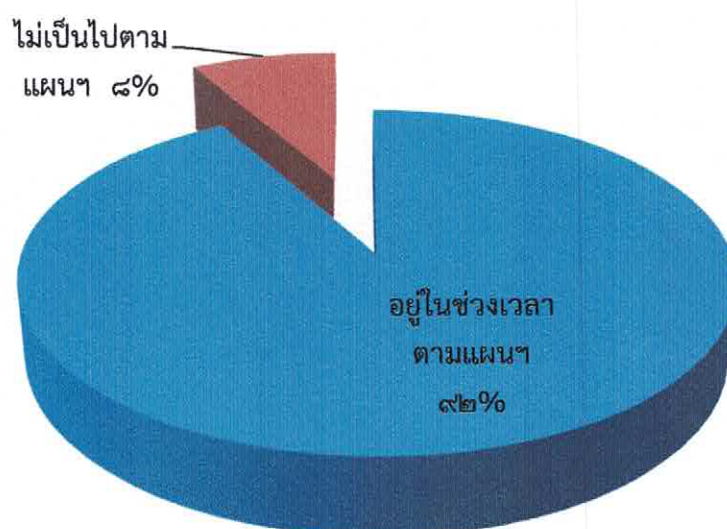

รูปที่ ๓ แสดงจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
ในแผนการดำเนินงานประจำปี และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ และฉบับเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลเชิงปริมาณ

๑. การประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ๑.๑ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และฉบับเพิ่มเติมทั้งหมด ๑๕๗ โครงการ
- ๑.๒ สามารถนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๗

๒. การประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ๒.๑ จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และฉบับเพิ่มเติม จำนวน ๓๗ โครงการ
- ๒.๒ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๐ และไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑
- ๒.๓ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๕ และยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖

การประเมินผลเชิงคุณภาพ

๑. การประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณด้านการพัฒนา จึงทำให้จำนวนโครงการที่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณมีอัตราส่วนที่น้อยในอัตราร้อยละ ๒๓.๕๗

๒. การประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๑ ความสามารถในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน สามารถดำเนินการตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงานโดยกำหนดเวลาการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับการจัดสรร โดยสัดส่วนของโครงการที่อยู่ในระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน อยู่ที่ร้อยละ ๙๑.๙๐ และไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๘.๑๑

๒.๒ ความสามารถในการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด ร้อยละ ๔๓.๒๕ ของแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เนื่องจากต้องรองบประมาณการจัดสรรรายได้ให้แก่ท้องถิ่นที่จะทยอยจัดสรรเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔

แบบสรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบครึ่งปีงบประมาณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์	จำนวนโครงการทั้งหมด	การดำเนินการตามแผนในรอบครึ่งปีงบประมาณ		การดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ในช่วงเวลาดำเนินการ	ไม่ปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๘	๑	๗	๘	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๒	๖	๖	๑๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑		๑	๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑		๑		๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๓	๑	๒	๒	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๒	๒		๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๖	๓	๓	๕	๑
รวม	๓๓	๑๓	๒๐	๓๐	๓

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการด้านสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท) (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินการ โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายตะวันตกกิโลเมตร ๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสำโรง	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนฯ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านป่าแฝก หมู่ที่ ๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.ระโนดกำหนด	๗๒๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านระโนด	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนฯ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาทรายจ่าง หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ระโนดกำหนด	๔๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านปากบาง	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนฯ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการด้านสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท) (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๔	โครงการปรับปรุงขยายถนน ลูกรังสายหน้าหลวช่วงปลาย คลองหน้าหลวถึงแยกคลอง ไสหร้า หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑.๒๓๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งรายละเอียด อื่นตามแบบที่ อบต. ระโนดกำหนด	๔๔๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านหิรัญ	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนที่
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอบเหมืองสาย ๓ ฝั่งตะวันตก เชื่อมต่อสาย ๒ หมู่ที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑.๒๓๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. พร้อม บดทับ รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต. ระโนดกำหนด	๔๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านมหากา	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนที่
๖	โครงการปรับปรุงลานอเนก ประสงค์บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๕	ถนนลูกรังกว้าง ๔.๘ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมบดทับ หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตร.ม. และพื้นที่ คสล. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตร.ม. รายละเอียดอื่นตามแบบ ที่ อบต. ระโนดกำหนด	๔๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านโคกทอง	กองช่าง	ลงนามใน สัญญาแล้ว	๔๔๕,๐๐๐	๑๐.๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนที่

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการด้านสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Solar Street Light ถนนสายชาตรี หมู่ที่ ๒	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบ Solar Street Light ขนาดเสาสูงไม่น้อยกว่า ๔ ม. จำนวน ๑๕ ต้น รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.ระโนดกำหนด	๓๐๐,๐๐๐ (บาท)	หมู่ที่ ๒ บ้านเฉื่อยพง	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนที่

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการด้านสร้างพื้นฐาน
(๔) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๑	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ สายบ้านเฉื่อยพงถึงป่าช้า หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๓	ขุดลอกเหมืองเหมืองความกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม. ปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๖๕๐ ม. พร้อม เกลี่ยแต่งดินขุดเรียบร้อยแล้ว	๓๐๐,๐๐๐ (บาท)	หมู่ที่ ๒ บ้านเฉื่อยพง ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านปากบาง	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนที่

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน ทั้งในด้านการสอน การบริหารและการพัฒนา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต /งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินการ โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กในเขตพื้นที่ตำบล ระโนด และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แสดง ความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกใน เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	อาคาร โดกทอง หมู่ที่ ๕	กอง การศึกษาฯ	ดำเนิน การแล้ว	๗๗,๔๗๘	๑๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๗	ดำเนินการได้ ตามแผนฯ
๒	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	จัดส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -อบต.ระโนด(วัดจาก)เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการตามพื้นที่หน่วยงาน ภายนอกจัดขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ๓๒ คน	๑๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนฯ
๓	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต.ระโนด(วัดจาก)	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานำมา ปรับใช้ในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ดีขึ้นกลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลระโนดและคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ร.พ.ระโนด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต /งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นภายในตำบลระโนด เช่น การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการฉีดพ่นหมอกควัน การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ	๕,๐๐๐	ตำบลระโนดทั้ง ๗ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	๓๘๐	๕๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.-๖๗	อยู่ในช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปล่อยมือจากโรคพิษสุนัขบ้า	การดำเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการรณรงค์การฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวภายในตำบล	๒๐,๐๐๐	ตำบลระโนดทั้ง ๗ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง จากจำนวน ๒ ครั้ง ต่อปี	๑๐,๒๐๐	๕๐.๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๗ และ ก.ค.-ส.ค. ๖๗	อยู่ในช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	ตำบลระโนดทั้ง ๗ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลระโนดและคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ร.พ.ระโนด

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต /งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ระโนดคัพ ด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลระโนดกลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	สนามกีฬา หมู่ที่ ๓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗	อยู่ในช่วงเวลาตามแผนฯ
๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดมหาการ ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ด้านยาเสพติด	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดมหาการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ด้านยาเสพติด โดยจัดร่วมกับกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลระโนด กลุ่มเป้าหมายนักเรียน ๕๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนวัดมหาการ	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	มี.ย.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วงเวลาตามแผนฯ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลระโนดและคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ร.พ.ระโนด

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต. ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลระโนด	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๗	อยู่ในช่วงเวลาตามแผนฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพของ อสม. โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลระโนดและคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ร.พ.ระโนด

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบล ระโนด	๘,๖๕๓,๓๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักงานปลัด	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ	๔,๒๔๐,๒๐๐	๕๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่อยู่ในเขต ตำบลระโนด	๒,๓๐๔,๐๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักงานปลัด	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ	๑,๐๕๖,๐๐๐	๕๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	การจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้เอดส์ที่อยู่ใน เขตพื้นที่ตำบลระโนด	๘๔,๐๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักงานปลัด	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการประสานงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระโนนดีในการสนับสนุนทางวิชาการและการฝึกอบรมด้านอาชีพและวิชาชีพชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินงานโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน โครงการ
๑	โครงการฝึกอบรมการเข้าถึง สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ และผู้พิการ	การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ ของทางภาครัฐที่ ประชาชนควรทราบ	๑๕,๐๐๐	ศาลา โคกทอง หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกของ อบต.ระโนด และดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ
๑	โครงการ Big Cleaning Day	การจัดกิจกรรมสงสารรักโลก กิจกรรม คลองสายน้ำใสร่วมกับ อตต.อบต. ระโนด การรณรงค์การคัดแยกขยะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นอุปกรณ์ ป้ายไวนิล โครงการ ฯลฯ	๕,๐๐๐	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๖ มี.ค.-เม.ย.๖๗ ก.ค.-ส.ค.๖๗	ไม่เป็นไปตามแผน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

๕.๑ กลุ่มยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาการจัดงานประเพณีภายใต้วิถีและอัตลักษณ์ของตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	การจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เช่น การแห่เทียน floats ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	เม.ย.๖๗	ไม่เป็นไปตามแผน
๒	โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง	การจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ	๓๐๐,๐๐๐	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๒๕๐,๕๓๒	๑๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนให้วัดในพื้นที่ตำบลโนนสูงเพื่อจัดทำเรือพระในประเพณีออกพรรษาเป็นประจำทุกปี

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินการ
๓	โครงการอุดหนุนวัดในเขตพื้นที่ อบต.โนนสูง ตามโครงการอุดหนุนประเพณีลากพระประจำปี	อุดหนุนวัดในเขตพื้นที่ อบต.โนนสูง จำนวน ๕ วัด วัตถุประสงค์ วัดจาก วัดระโนด วัดเลิงพ่องและวัดมหาดไทย	๓๕,๐๐๐	ตำบลระโนด	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	อยู่ในช่วงเวลาตามแผน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและความมั่นคงปลอดภัย

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

(๑) แผนงานการรณรงค์ความปลอดภัยใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินการ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๑	โครงการเฝ้าระวังช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย	การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ช่วงเทศกาล การดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทาง ถนนตามแนวทางของ สปปอ. อบต. ระโนด	๑๕,๐๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง จาก จำนวน ๒ ครั้ง ต่อปี	๕๐.๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗ และ เม.ย.๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงบกลางให้เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

(๑) แผนงานการรณรงค์ความปลอดภัยใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนินการ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	การช่วยเหลือประชาชนในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ก่อนเกิด ภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย	๑๕๐,๐๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ	๕๐.๐๐	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดการประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานของ อบต.ระโนด และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินโครงการ
๑	โครงการ อบต.ระโนด พบประชาชน	การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบลระโนด	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการ ตลอดปี งบประมาณ	๑,๔๒๕	๕๐.๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๖ มี.ค.เม.ย.๖๗ ก.ค.ส.ค.๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการต่าง ๆ	การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ หรือข้อสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอำนาจ ฯลฯ	- ๑๐,๐๐๐	ตำบลระโนด	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนฯ
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง	๓๐,๐๐๐	อาคาร อเนกประสงค์ ศพด.	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนฯ
๔	โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่นงานรัฐพิธีงานพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เติ้ตพระเกียรติ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบลระโนด	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการ ตลอดปี งบประมาณ	๓,๐๐๐	๕๐.๐๐	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานของ อบต. ระโนด และส่งเสริม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนิน โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๕	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบต.เสถียร ที่กลาง	เงินอุดหนุนให้แก่ อบต.แสนสงวน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๓,๐๐๐	สถานที่ กลาง อ.ระโนด	สำนักงานปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ม.ค.-๖๗	ไม่เป็น ไปตามแผน

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนากระบวนการข้าราชการออนไลน์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนิน โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๖	โครงการประชาสัมพันธ์การ เสียภาษี	การดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี เช่น ค่าป้าย ไว้นิล ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	๕,๐๐๐	ตำบล ระโนด อ.ระโนด	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว	๕,๗๕๒	๑๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๖ - เม.ย.-๖๗	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ

แบบสรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
รอบครึ่งปีงบประมาณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ ๑.ระบอบ	จำนวนโครงการทั้งหมด	การดำเนินการตามแผนในรอบครึ่งปีงบประมาณ		การดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ในช่วงเวลาตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๓	๒	๑	๓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓					
ยุทธศาสตร์ที่ ๔					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕					
ยุทธศาสตร์ที่ ๖					
ยุทธศาสตร์ที่ ๗					
รวม	๓	๒	๑	๓	

ครุภัณฑ์

ประเภท	จำนวนโครงการทั้งหมด	การดำเนินการตามแผนในรอบครึ่งปีงบประมาณ		การดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ในช่วงเวลาตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	๑	๑		๑	
รวม	๑	๑		๑	

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๑.๑ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนิน โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดเหลี่ยมริมถนนสาย สข ๒๐๖๔ (สุขาภิบาลระโนด-ปากบางระโนด) ฝั่งทิศเหนือ ช่วงคลองเรือ - บ้าน นายเจริญ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร และรายละเอียด อื่นตามแบบที่ อบต.ระโนด กำหนด	๔๔๔,๐๐๐ (จ่ายสดเงินสด)	หมู่ที่ ๓ บ้านปากบาง	กองช่าง	ลงนามใน สัญญาจ้าง และดำเนิน การก่อสร้าง แล้ว	๔๔๔,๕๐๐	๙๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๗	ดำเนินการได้ ตามแผนที่ กำหนด
๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	ขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ วางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร ขึ้น PN๖ ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๕๐ เมตร และท่อ PB ๔๐ มิลลิเมตร ขึ้น SRD ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๔ เมตร และรายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต. ระโนดกำหนด	๔๙๐,๐๐๐ (จ่ายสดเงินสด)	หมู่ที่ ๑ บ้านมหาการ	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๗	อยู่ในช่วง เวลาตามแผนที่ กำหนด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานและเคหะชุมชน ๑.๒.๒ งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนิน โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ระโนด	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ระโนด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลระโนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ขยายเขตแรงดันต้นน้ำชุมชน หมู่ที่ ๔ ๒. ไฟสาธารณะขอยรั้านักกะที หมู่ที่ ๔ ๓. ถนนริมคลองไสหรำ หมู่ที่ ๔ ๔. ถนนสายริมคลองมหากการ หมู่ที่ ๑ ๕. ถนน คลส.กลางบ้านหมากการ หมู่ที่ ๑ ๖. ถนนสายมหากการ-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ๗. ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ๘. ไฟสาธารณะ-ถนนลูกรังสายโรงอิฐ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ๙. ไฟสาธารณะ-ถนน คลส.สายบ้านนอก บ้านเอื้องพง หมู่ที่ ๒	๓๐๕,๕๖๖.๗๖	หมู่ที่ ๑, ๒ ๓, ๔, ๕ ตำบลระโนด	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐๕,๕๖๖.๗๖	๑๐๐.๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗	ดำเนินการได้ ตามแผนฯ

ประเภทครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต /งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ของโครงการ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
๑	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ * ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๔๑๐ สังกัด หมายครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๑-๐๐๐๑	ซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกขยะโดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.ตัด/เปลี่ยนยางข้าง L/R สแตนเลส หนา ๓ มม.(ตัวถัง) ๒.ตัด/เปลี่ยนท่อนหลังคา สแตนเลส หนา ๓ มม.(ตัวถัง) ๓.ตัด/เปลี่ยน พื้นรับขยะ สแตนเลส หนา ๓ มม.(ตัวถัง) ๔.ตัด/เปลี่ยน พื้นดินขยะออก เหล็ก หนา ๔ มม.(ตัวถัง) ๕.ตัด/เปลี่ยน รางดินขยะออก L/R เหล็ก หนา ๔ มม.(ตัวถัง) ๖.ตัด/เปลี่ยน ขั้วล้อ L/R เหล็ก หนา ๒ มม (ตัวถัง) ๗. ตัด/เปลี่ยน ถังน้ำเสีย สแตนเลส หนา ๒ มม. (ตัวถัง) ๘. ตัด ปะลุ ซ่อมชุดสไลด์ เหล็ก หนา ๓ มม. (ชุดอัติโนมัติ) ๙. ลูกลอยกันน้ำด้านท้าย (ชุดอัติโนมัติ) ๑๐.ตัด/เปลี่ยนสไลด์ใบกวาด (ชุดอัติโนมัติ)	๔๘๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๘๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๗	ดำเนินการได้ ตามแผนฯ

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต /งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนิน โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนิน โครงการ
		๑๑. คัดแปลงกระบอกลูกข่ายแบบสื่อออกได้/ เดินระบบท่อน้ำมัน (ชุดอัดท้าย) ๑๒. เปลี่ยนพรหมเชอร์เกจ ๑๓. เดินระบบไฟ (เฉพาะจุดซ่อม) ๑๔. ทำสีใหม่ ตัวถังและชุดอัดท้าย ๑๕. คัดเทพลาสติกเกอร์สะท้อนแสง								

แบบสรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
รอบครึ่งปีงบประมาณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์	จำนวนโครงการทั้งหมด	การดำเนินการตามแผนในรอบครึ่งปีงบประมาณ		การดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ในช่วงเวลาดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑					
ยุทธศาสตร์ที่ ๒					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓					
ยุทธศาสตร์ที่ ๔					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕					
ยุทธศาสตร์ที่ ๖					
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๑	๑		๑	
รวม	๑	๑		๑	

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานของ อบต.ระโนดและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต /งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะ การดำเนิน โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ ความคืบหน้า ของโครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน โครงการ
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ อบต.ระโนด ได้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และคณะทำงาน ของ อบต.ระโนด ที่ อบต.ระโนด มอบหมายให้ ปฏิบัติงานหรือหน้าที่ในโครงการ อบรมการ ของ อบต.ระโนด ณ จังหวัดตรัง ภูเก็ต และกระบี่	๑๗๐,๐๐๐	จังหวัด ตรัง กระบี่ ภูเก็ต	สำนักงานปลัด	ดำเนิน การแล้ว	๑๖๐,๐๕๒	๑๐๐	มี.ค.	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ
